

# LE JOURNAL DU MUR

Rédacteur en chef : Jean-Paul Morlier

Réalisation : Dominique Valleton

## Remerciements

Nos remerciements vont à la DRAC et ELAN pour la fourniture de subventions et à un généreux donateur sans qui la réfection de ce mur n'aurait pu avoir lieu.

## Bref historique

Suite à un Permis de Construire accepté en 2021 et grâce aux subventions obtenues au niveau de la DRAC-Ministère de la culture Nouvelle-Aquitaine et du fonds européen FEADER à travers la communauté de communes ELAN et la région Nouvelle Aquitaine, il a été décidé par le Conseil d'administration de la SASSAG en date du 2 mai 2022 de procéder à la reconstruction d'une partie du mur de terrassement Sud.

## Position du mur sur le site

Il s'agit de la portion Sud-retour Est du mur de terrassement à l'angle de la rue de la porte de la voûte et de la route des Barrys. Complètement écroulé et menaçant le domaine public sur la partie route de la voûte, cette partie du mur possédait par ailleurs une hauteur particulièrement intéressante (d'origine ?) sur le retour vers la route des Barrys



## Accès aux mois

[Juin](#)

[Juillet](#)

[Août](#)

[Septembre](#)


[Octobre](#)

[Novembre](#)


# AVANT LES TRAVAUX



Vue générale du mur avant les travaux à l'angle rue de la porte de la voûte et de la route des Barrys

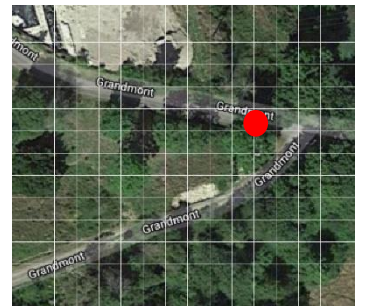

Vue du mur avant les travaux côté rue de la porte de la voûte

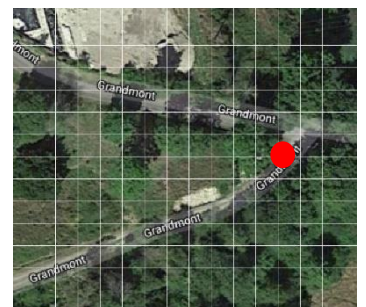


# JUIN 2023


16 juin : début des travaux



Préparation du chantier de reconstruction : échafaudage pré-ventif par l'entreprise « Les chantiers des chemins jacquaires »

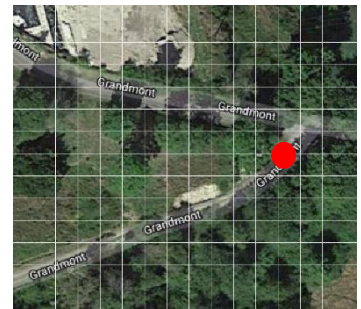

Dessouchage préliminaire par l'entreprise Nicolas Boulestin

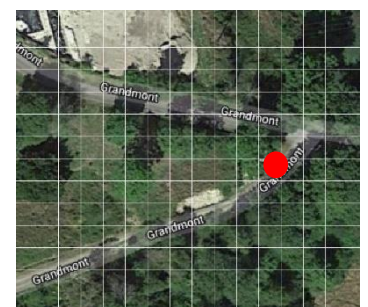



Balustres ? et petite applique découvertes lors des premiers travaux de terrassement



Préparation du chantier de reconstruction : nettoyage des moellons par l'entreprise « Les chantiers des Chemins >Jacquaires »


27 juin : travaux sur le retour du mur vers la route des Barrys



Décapage du contrefort et découverte d'un second mur côté route des Barrys




Découverte d'un second contrefort perpendiculaire au premier

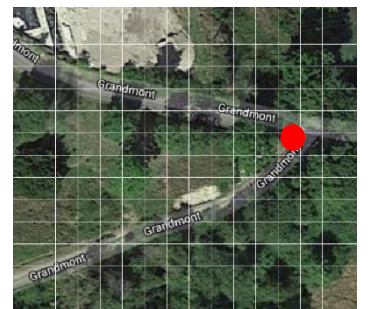

## 28 juin : préparation le long de la rue de la voûte



Nettoyage et décapage du talus côté rue de la porte de la voûte, découverte d'un mur en arrière, prolongement de celui mis au jour côté route des Barrys et de soubassements de l'ancien mur

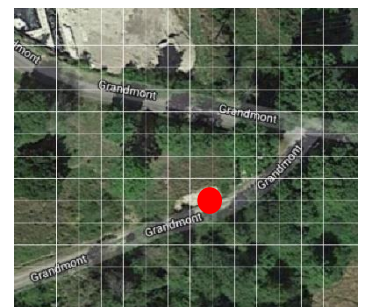

Mise en place de sondages par les équipes d'archéologues

# JUILLET 2023

10 juillet : fin de l'étape préparatoire



Derniers sondages et relevés pierre à pierre par les équipes d'archéologues



Etat du retour Est avant le début de la reconstruction

13 juillet : état du site avant reconstruction



Position du repère géodésique du projet « fouilles »





## 17juillet : Début de la reconstruction



Pose de la première pierre du mur, côté rue de la Porte de la Voûte.



Les maçons des Chantiers Jacquaire

## 19 juillet : pince à bloc de pierre



Force et précision




## 19 juillet : réserve des blocs de pierre



Préparation des moellons

## 28 juillet : Suite de la reconstruction

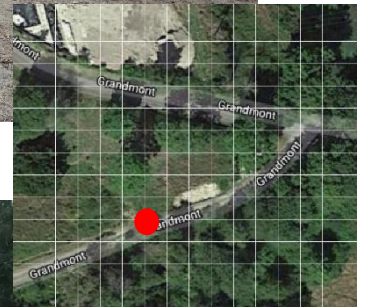

**28 juillet : Suite de la reconstruction**



Vue depuis la route des Barrys


**31 juillet : Suite de la reconstruction**



Vue depuis la route des Barrys

# AOÛT 2023

## 2 août : Intempéries sur Grandmont

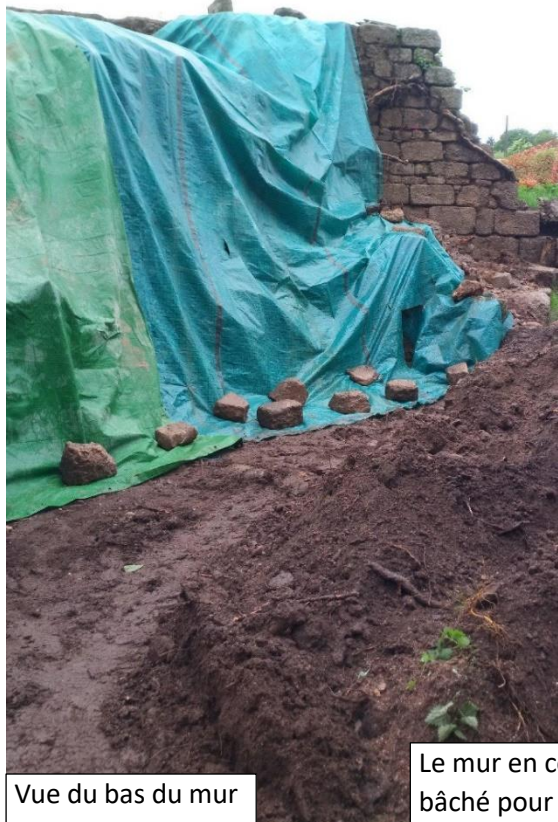

Le mur en cours de reconstruction est bâché pour éviter tout éboulement



### 3 août : Préparation du raccordement avec le contrefort



Vue vers la route des Barrys



Vue depuis la route des Barrys



#### Des évènements imprévisibles sur le chantier...

Lors de la préparation du site pour la reconstruction du mur de **nouvelles fondations** ont été découvertes, des relevés précis ont dû être effectués par les archéologues. Les **intempéries** sur le site ont également fortement retardé les travaux.

**Ces faits retardent la fin des travaux d'environ un mois.**

## 8 août : Le grand mur



Première assise du grand mur



En pleine reconstruction du grand mur




André Larigauderie surveillant la mise en place du mur coupé

## 11 août : L'angle des murs



Angle des murs sud et est (depuis la route des Barrys)

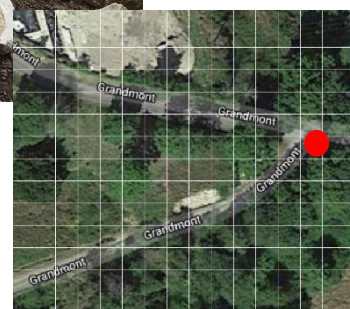

## 16 août : L'angle des murs est et sud



Le mur est (depuis la route des Barrys)



16 août : L'angle des murs est et sud



Pan coupé et mur est (depuis la route des Barrys)



Pan coupé et mur est (depuis la route des Barrys)


## 21 août : L'angle des murs est et sud



Pan coupé et mur est, le stock de blocs de pierre



Angle du pan coupé et du mur est

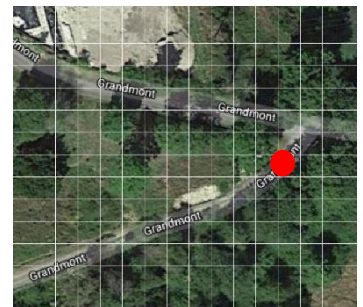

Angle du pan coupé et du mur sud

## 25 août : Le mur Est à la jonction avec le mur Sud



# SEPTEMBRE 2023


4 septembre : La jonction du mur Sud avec le mur Est



Angle du mur sud et du mur est, vue de dessus (détail)



Mur est, en cours de montage

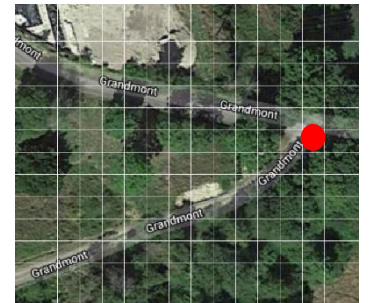



Pan coupé et mur est


## 7 septembre : La jonction du mur Sud avec le mur Est



Vue de dessus




Vue de dessus - Calage des blocs

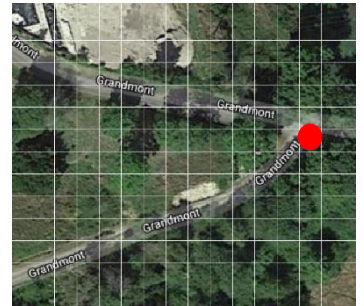

## 8 septembre : Le début du mur Est




## 11 septembre : La jonction du mur Sud avec le mur Est (suite)

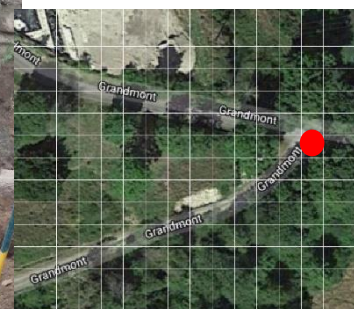

## 12 septembre : Suite du mur Sud




Préparation le long de la rue de la porte de la voûte

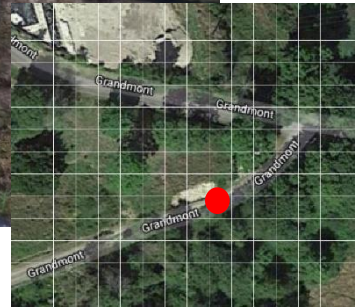

## 14 septembre : Suite des murs Sud et Est




Vue de dessus du mur sud

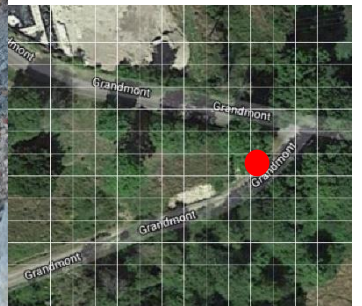

17 septembre : Etat du raccordement des murs Sud et Est




Vue d'ensemble (raccordement murs sud et est)

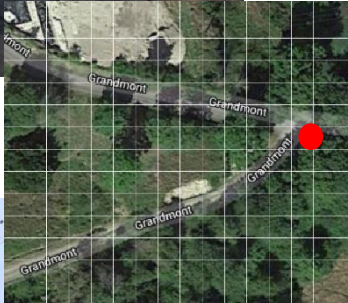




19 septembre : Préparation d'une nouvelle section du mur Sud

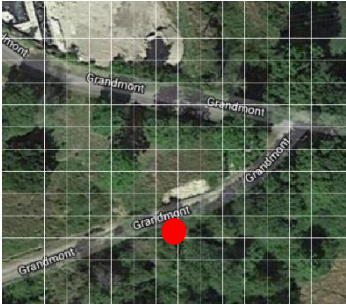



La réserve de matériaux ...

22 septembre : Etat de préparation de la deuxième tranche des travaux du mur Sud

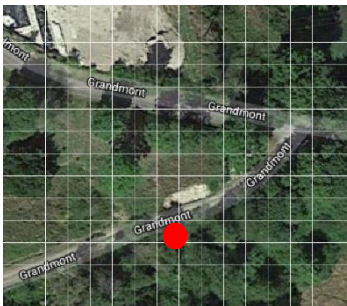

27 septembre : Début de la deuxième tranche des travaux du mur Sud



L'arrière du mur




Le pied du mur



# OCTOBRE 2023

**1<sup>er</sup> octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud**

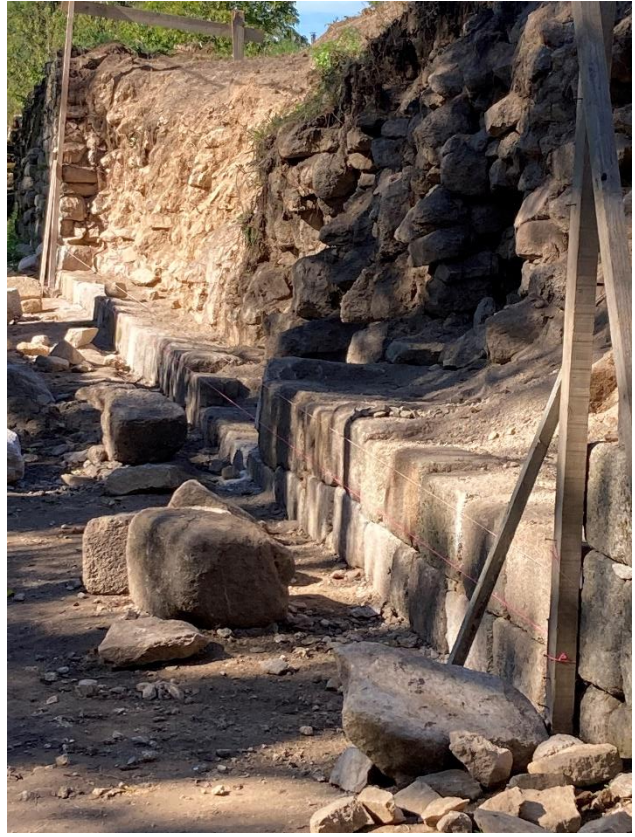

**4 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud**



Détail de pose



La deuxième tranche de reconstruction se déroule ici

### 5 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud



Troisième rang

### 6 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud



Quatrième rang

**17 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud (suite)**




**L'extrémité de la reconstruction du mur**



## 17 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud (suite)



Vue depuis la maison Loustaud

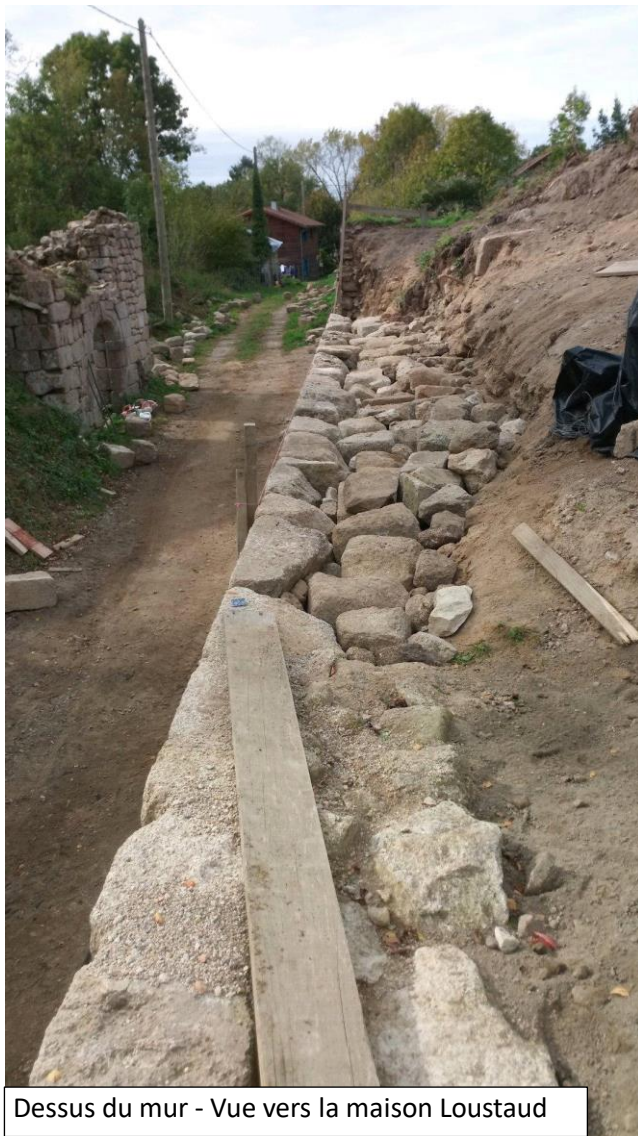

Dessus du mur - Vue vers la maison Loustaud



## 20 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud (suite)




Vue du mur vers la route des Barrys



Détail du mur



Raccordement avec le mur existant

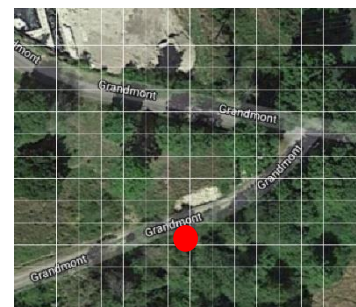

24 octobre : Deuxième tranche des travaux du mur Sud (suite)



6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> rangs et la maison Loustaud



Avant ...



Jonction avec le mur sud restant



Détail de la reconstruction

## 27 octobre : travaux du mur Sud



Raccord avec mur existant



Vue depuis route des Barrys



Vue vers route des Barrys



Vue vers route des Barrys et maison Loustaud



Vue extrémité est

## 31 octobre : la fin des travaux du mur Sud



Vue vers route des Barrys



Finition du dessus du mur



Vue depuis la maison Loustaud



Extrémité du mur près de la route des Barrys

### **3 novembre : inauguration du mur**

**L'inauguration du mur sud reconstruit s'est déroulée le vendredi 3 novembre 2023.**

**62 personnes étaient présentes.**

Les organismes suivants étaient représentés :

**La DRAC** (Direction Régionale des Actions Culturelles) par N. Vedelago, Conservateur régional-Adjoint des Monuments Historiques, représentant M. Pesneau, Préfet de la Haute-Vienne et Mme Mousset, Conservatrice régionale Adjointe pour l'Archéologie.

**La communauté de commune ELAN**, par M. P. Vallin (élu)

**La Mairie de Saint-Sylvestre** par Mme A. Terrana, Maire

**Le comité de tourisme Monts du Limousin** par Mme Dupic

**La SASSAG** (Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l'Abbaye de Grandmont), par JF. Mougnaud, Président d'honneur, F. Mougnaud, Président et JP. Morlier, vice-Président.

Le déroulement de cette cérémonie a été le suivant :

- Discours d'accueil par JP. Morlier, vice-Président de la SASSAG
- Présentation du déroulement de l'après-midi par F. Mougnaud, Président de la SASSAG
- Dévoilement de la plaque inaugurale de la reconstruction du mur sud de l'Abbaye par N. Vedelago, A. Terrana, JF. Mougnaud, F. Mougnaud
- Visite le long du mur et explications relatives aux travaux de sa reconstruction
- Passage par le jardin de l'Abbaye avec les précisions de F. Lassoujade
- Présentation du cloître mis au jour lors des fouilles 2023, par le Professeur Ph. Racinet
- Pot de l'amitié, cidre artisanal, offert par Mme Savary adhérente de la SASSAG
- Possibilité de suivre les principales étapes de la construction à partir du reportage « Journal dumur » assuré depuis le début du chantier, sur le site internet de la SASSAG, par son secrétaire, D. Valleton.



Discours d'accueil de JP Morlier, vice-Président de la SASSAG



Au pied du mur, présentation des travaux réalisés



La plaque inaugurale sous son voile

De gauche à droite, JF. Mougnaud, N. Vedelago, A. Terrana, F. Mougnaud



Dévoilement de la plaque inaugurale du mur



La plaque inaugurale dévoilée



Le mur reconstruit, le long de la rue de la voûte





F Lassoujade présente le jardin de l'Abbaye



Le Professeur Ph Racinet présente les éléments du cloître (Fouilles 2023)



Les Trésorières au service du pot de l'amitié

Société des Amis  
et de l'Abbaye



de Saint-Sylvestre  
de Grandmont

**Le 3 novembre 2023, il a été procédé à l'inauguration  
du mur sud de l'Abbaye de Grandmont.**

Ce mur a été reconstruit sur les bases du mur de soutènement  
originel du site de l'abbaye par l'association Les Chantiers des  
Chemins Jacquaires et l'aide de l'entreprise N. Boulestin.

Le financement de ce chantier a été assuré grâce au soutien de la DRAC  
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la communauté de  
communes ELAN (financement de l'Union Européenne), des cotisations  
et des dons des adhérents de la SASSAG.

*Fin.*
